

Cliente / Fiscalização:

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

RID N° <u>161/10</u> DATA <u>03/09/2010</u> Fls. <u>01/03</u>

Data:


CLIENTE: COMASA			OS: 4570			
EQUIPAMENTO: PAREDE INTERMEDIARIA						
DESENHO: 023.039A.046-R0						
The state of the s						
PROCEDIMENTO: IT-06 R2						
Resultado das Verificações						
Item	Posição/Cota/Número	Medida Especificada (mm)	Medida Encontrada (mm)	Diferença Encontrada (mm)	Tolerância Especificada (mm)	Observação
01	01	500	499	-1	±3	
02	02	800	803	+3	±3	
03	03	800	800	0	±3	
04	04	800	799	-1	±3	
05	05	800	802	+2	±3	
06	06	1500	1500	0	±4	
07	07	800	797	-3	±3	
08	08	800	803	+3	±3	
09	09	800	800	0	±3	
10	10	800	800	0	±3	
11	11	500	500	0	±3	
12	12	357	355	-2	±3	
13	13	1020	1020	0	±4	
14	14	1020	1020	0	±4	
15	15	1020	1020	0	±4	
16	16	1020	1020	0	±4	
17	17	1020	1020	0	±4	
18	18	1020	1020	0	±4	
19	19	1020	1020	0	±4	
20	20	1020	1020	0	±4	
21	21	255	255	0	±2	
22	22	551	550	-1	±3	
23	23	1119	1121	+2	±4	
24	24	2580	2583	+3	±3	
25	25	635	637	+2	±3	
26	26	7252	7253	+1	±8	
27	27	14358	14346	-12	±12	***************************************
Instrumentos de medição: Trena (5metros): 1808 - Trena (30metros): 1769						
Observações: Medidas aprovadas de acordo com critérios de aceitação classe de tolerância B – IT 06.						
Todos os certificados dos instrumentos de medição foram analisados, estando conforme;						
(*) cotas identificadas no desenho;						
RELATÓRIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA						
LAUDO: APROVADO RNC						grotiar andi
	REPROVADO					
Inspecionado por: Gerson A. Meier Visto: 100 Data: 06 1 09 1 10						
Controle da Qualidade: Castro F. Schumann Visto: Data: EG 120 120						

Visto:

Bíochamm CALDEIRAS

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL PAREDE INTERMEDIARIA – COMASA - DES. 023,039A.046-R0

RID N° <u>161/10</u> DATA <u>03/09/2010</u> FIS. <u>02/03</u>

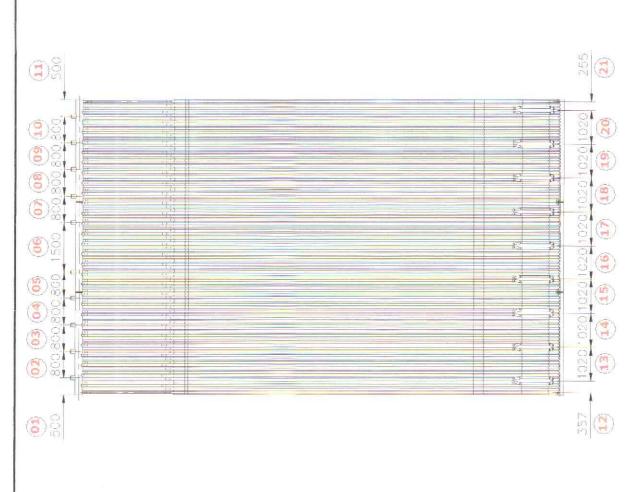

Biochamm CALDEIRAS

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL PAREDE INTERMEDIARIA – COMASA - DES. 023.039A.046-R0

DATA 03/09/2010 RID Nº 161/10 FIs. 03/03

